

Postes budgétaires - CSVP

Pays – Province – Ville	Iraq – Kurdistan – Ankawa
Directeur de projet	François-Xavier Gicquel
Camp / Familles isolées	Ashti camp
Date de début (Ecole)	01/02/2015
Date de fin (Ecole)	21/04/2015
Date de début (Clinique)	03/11/2014
Date de fin (Clinique)	15/12/2014

Objectifs des projets

Objectif 1 : Ouverture d'une école à Ankawa

Objectif 2 : Ouverture d'une clinique à Ankawa

Résultats attendus

- Permettre l'accès à l'éducation de 500 à 600 enfants déplacés
- Permettre l'accès aux soins de 10 000 déplacés

Commentaires

- L'école sera composée de 10 préfabriqués. 2 seront affectés au personnel, le reste servira de classes (cf Annexe 1)
- La clinique sera composée d'une pharmacie et son stock, de 3 cabinets de consultations médicales, d'une salle de soins, d'un dortoir, d'un cabinet de dentiste, d'un laboratoire d'analyses et d'une salle radio (cf Annexe 2)

Acteurs Ecole

Prénom-Nom	Fonction	Téléphone / Mail
Mgr Bashar Warda	Evêque Chaldéen d'Erbil	+964 (0)7504106267
Andy Ilhwsainy	Maître d'œuvre	+964 (0)7510109576
M. Basim	Directeur de l'éducation - Ninive	Voir Danny (arabe uniquement)
Yasmine Colijn	Directeur du camp - ACTED	Yasmine.colijn@acted.org

Plan d'actions Ecole

Libellé	Date prévue	Date de réalisation
Contacteur Mgr Bashar Warda pour obtenir le terrain	03/01/2015	06/01/2015
Rencontrer M. Basim pour lancer le recrutement et la procédure admin.	07/01/2015	07/01/2015
Lancer l'enregistrement des élèves	15/01/2015	
Réaliser/adapter les plans aux vues de la localisation	15/01/2015	
Lancer le terrassement/dalle de béton/graviers/grillage	20/01/2015	
Lancer la construction des préfabriqués	20/01/2015	
Dépôt des préfabriqués	30/01/2015	
Pose des climatiseurs	01/02/2015	
Faire la demande officielle d'enregistrement de l'école	10/02/2015	
Ameublement de l'école	15/02/2015	
Achat des fournitures pour un trimestre	19/02/2015	

Budget Ecole

Libellé	Quantité	PU en dinards	Montant en dinards	Montant en dollars	Montant en euros
Terrassement / Béton/Graviers	1	18 000 000	18 000 000	15 000	12 096
Grillage	1	4 680 000	4 680 000	3 900	3 145
Préfabriqué 8X3.5/1 porte/2 fenêtres/2 lum	10	4 800 000	48 000 000	40 000	32 260
Dépenses structurelles (élec., eau...)	1	6 000 000	6 000 000	5 000	4 032
Meubles	X	1 800 000	1 800 000	1 500	1 210
Fournitures			3 600 000	3 000	2419
Total général			82 080 000	68 400	55 162

Participation CSVP Ecole

Libellé	Montant
Participation préfabriqués	15 000€ (Reçus) + 5 650 € (Reçus, reliquat clinique réaf.)
Terrassement / Béton / Graviers	12 096 € (Promesse de don)

Acteurs Clinique

Prénom-Nom	Fonction	Téléphone / Mail
Père Benham	Responsable Mart Schmony Clinic	+964 (0)7711738708
Sœur Diana	Mart Schmony Clinic	+964 (0)7707165778
Mr. Munther	Architecte	+964 (0)7502262389
Andy Ilhwsainy	Maître d'Oeuvre	+964 (0)7510109576

Plan d'actions Clinique

Libellé	Date prévue	Date de réalisation
Demande officielle de la clinique de Mart Schmony	03/11/2014	03/11/2014
Réalisation des plans par l'architecte	05/11/2014	05/11/2014
Réalisation de la dalle de béton par le Danish Refugee Council	15/11/2014	JAMAIS
Réponse de l'Eglise quant à la permanence du lieu d'accueil initial	20/11/2014	25/11/2014
Réalisation de la dalle de béton	30/11/2014	08/11/2014
Réalisation et livraison du nouveau préfabriqué	14/12/2014	15/12/2014
Transfer des préfabriqués de Mart Schmoni	13/12/2014	13/12/2014


Budget Clinique

Libellé	Quantité	PU en dinards	Montant en dinards	Montant en dollars	Montant en euros
Dalle de béton	1	4 080 000	4 080 000	3400	2 740
Préfabriqué 7X3m	2	4 080 000	8 160 000	6800	5 480
Container 12X2, 5m	1	24 000 000	24 000 000	20 000	16 129
Climatisation	4	420 000	1 680 000	1 400	1 130
Total général			37 920 000	31 600	25 479

Participation CSVP

Libellé	Montant
Dalle / Préfabriqués / climatisations	9 350 €

Annexe 1 : Ecole Ankawa

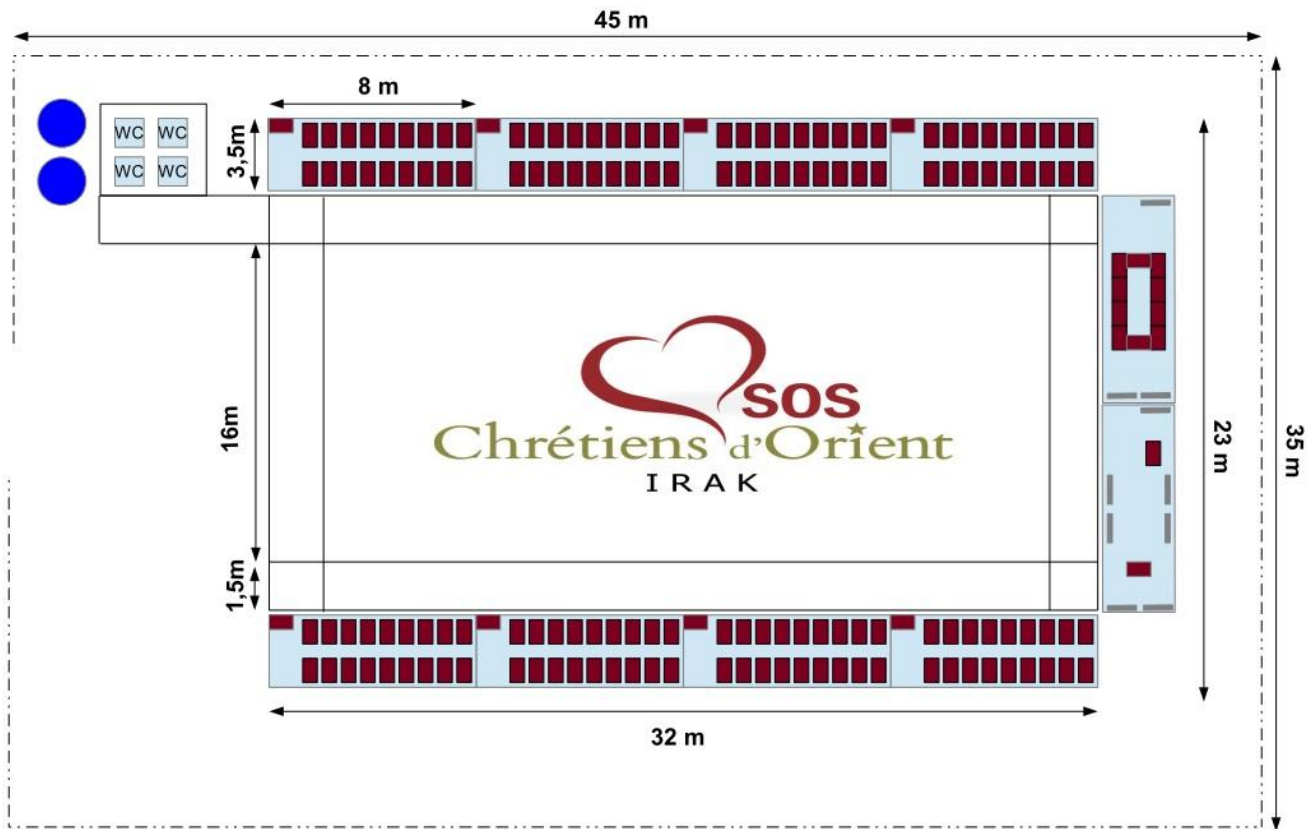

Annexe 2 : Clinique Ankawa

